

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **16.02.2017**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave**

---

**Predkladateľ:**

JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.  
primátor

**Zodpovedný:**

RNDr. Želmíra Greifová v.r.  
vedúca oddelenia stratégie a projektov

Ing. Vladimír Michálek v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s.

**Spracovateľ:**

Ing. Monika Balcieráková v.r.  
Oddelenie stratégie a projektov

Ing. Alžbeta Dugasová v.r.  
Metro Bratislava, a.s.

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD v Bratislave
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 20.04.2015
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 15.06.2015
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 21.09.2015
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 12.10.2015
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 9.11.2015
9. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 7.12.2015
10. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 7.3.2016
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 4.4.2016
12. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 6.6.2016
13. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov zo dňa 22.9.2016
14. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov zo dňa 17.10.2016
15. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov zo dňa 7.11.2016
16. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov zo dňa 28.11.2016
17. Uznesenie z Mestskej rady

## **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

### **A. berie na vedomie**

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

### **B. schvaľuje**

zmenu termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 55/2015 časť B zo dňa 26.2.2015 z pôvodného termínu „mesačne“ na nový termín „3 mesiace“.

## **Dôvodová správa**

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS.

V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky).

# Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

## A. NS MHD I. časť - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE

### 1.1. Realizácia stavby

- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015
- všetky objekty boli prebraté k 15.12.2015
- drobné vady, ktoré boli zaevidované v niektorých objektoch, boli odstránené do kolaudačných konaní
- zariadenie staveniska bolo úplne vypratane po odstránení všetkých drobných vád a nedostatkov

### 1.2. Finančné plnenie

K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 69,033 mil. eur s DPH. Faktúra za mesiac november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 2015. Faktúra za december 2015 bola uhradená formou refundácie zo strany RO OPD v januári 2016.

### 1.3. Stavebný dozor (SD)

SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 24.05.2016).

### 1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

### 1.5. Kolaudácie

BSK ŠSÚ pre stavby električkových a trolejbusových dráh a stavby na dráhe vydal povolenie na skúšobnú prevádzku na ucelenú časť „10 Staré mesto“ dňa 10.05.2016, ktoré bolo správoplatnené do 10.6.2016. Skúšobná prevádzka trvá do 30.10.2016.

BSK ŠSÚ pre stavby električkových a trolejbusových dráh a stavby na dráhe vydal povolenie na skúšobnú prevádzku na ucelenú časť „20 Starý most“ a ucelená časť „30 Petržalka“ dňa 30.05.2016, ktoré bolo správoplatnené do 04.07.2016. Skúšobná prevádzka trvá do 31.12.2016.

## **B. NSM MHD II. etapa - BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR**

Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou Reming, a. s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva s EKOJET, s.r.o., ktorý je zhotoviteľom zámeru EIA.

Dňa 5.2.2016 bol doručený zámer EIA na Hl. m. SR Bratislavu.

Dňa 8.2.2016 bol na Okresný úrad Oddelenie starostlivosti o životné prostredie v Bratislave podaný zámer EIA, kedy sa oficiálne spustil proces EIA. Zámer je zverejnený na stránkach Okresného úradu, Mestskej časti Petržalka. Okresný úrad vydal do 29.3.2016 Záverečné stanovisko z posúdenie.

Občania si zámer mohli prezrieť aj na Magistráte hl. m. SR Bratislavy do 14.3.2016.

Hl. mesto zriadilo emailovú adresu nsmhd2@bratislava.sk, na ktorú môžu občania zasielať otázky na projektový tím. Do 22.3.2016 bolo doručených 36 podnetov.

Dňa 26.5.2016 sa uskutočnilo prerokovanie na Okresnom úrade, Oddelenie starostlivosti o životné prostredie v Bratislave s názvom: Určenie rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu pre činnosť „ Nosný systém MHD prevádzkový úsek Janíkov dvor- Šafárikovo nám. v Bratislave. 2. časť Bosákova - Janíkov dvor“.

Zástupcovia Európskej komisie a JASPERS vzniesli na stretnutí s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 29.6.2016 odporúčanie na zahrnutie do projektovania Nosného systému MHD v Bratislave 2. časť aj cestný most ponad Chorvátskeho rameno na Kutlíkovej ulici v Petržalke.

Danú požiadavku vyslovil aj Krajský dopravný inšpektorát PZ v Bratislave na stretnutí s projektantom dňa 22.6.2016, inak nevydá súhlasné stanoviská k Dokumentácii pre územné rozhodnutie (ďalej len „DUR“) a ďalšie stupne PD pre el. trať do Petržalky.

Dňa 2.8.2016 bola podpísaná zmluva o dielo s EKOJET, s.r.o., na zhotovenie dokumentácie- správa o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre stavbu „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“.

Dňa 17.8.2016 sa konalo stretnutie na Krajskom dopravnom inšpektoráte PZ v Bratislave ohľadom doriešenia sporného bodu dopravného riešenia križovatky Betliarska- Lietavská.

Hlavné mesto SR pripravuje dodatok na dopracovanie dopravného riešenia premostenia Chorvátskeho ramena.

Dopravné riešenie križovatky Kutlíková a Pajštúnska (situovaná pri Technopole), ktoré nadväzuje na NS MHD 2. časť je v súčasnom období realizované ako 2- prúdová cesta. NS MHD 2. časť počítá pred mostom so 4-prúdovou komunikáciou, ktorá nadviaže na 2- prúdovú komunikáciu a za mostom opäť na 4- prúdovú komunikáciu.


Na Komisii dopravy a informačných systémov bola vznesená požiadavka na premostenie Chorvátskeho ramena zo západnej strany pre peších a cyklistov ku zastávke Gessayova (obrázok č.1). Oddelenie stratégie preverilo danú požiadavku. Požadované premostenie je mimo riešeného projektu.

V 40. týždni došlo ku dohode s Krajským dopravným inšpektorátom PZ v Bratislave na riešení križovatky Lietavská- Betliarská.

Dňa 3.11.2016 bola na Hlavné mesto SR odovzdaný koncept Správy o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Dňa 15.11.2016 bola na Okresný úrad Bratislava doručená Správa o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Počas 47. týždňa bude materiál distribuovaný na dotknuté orgány.

Obrázok č.1 Zastávka Gessayova

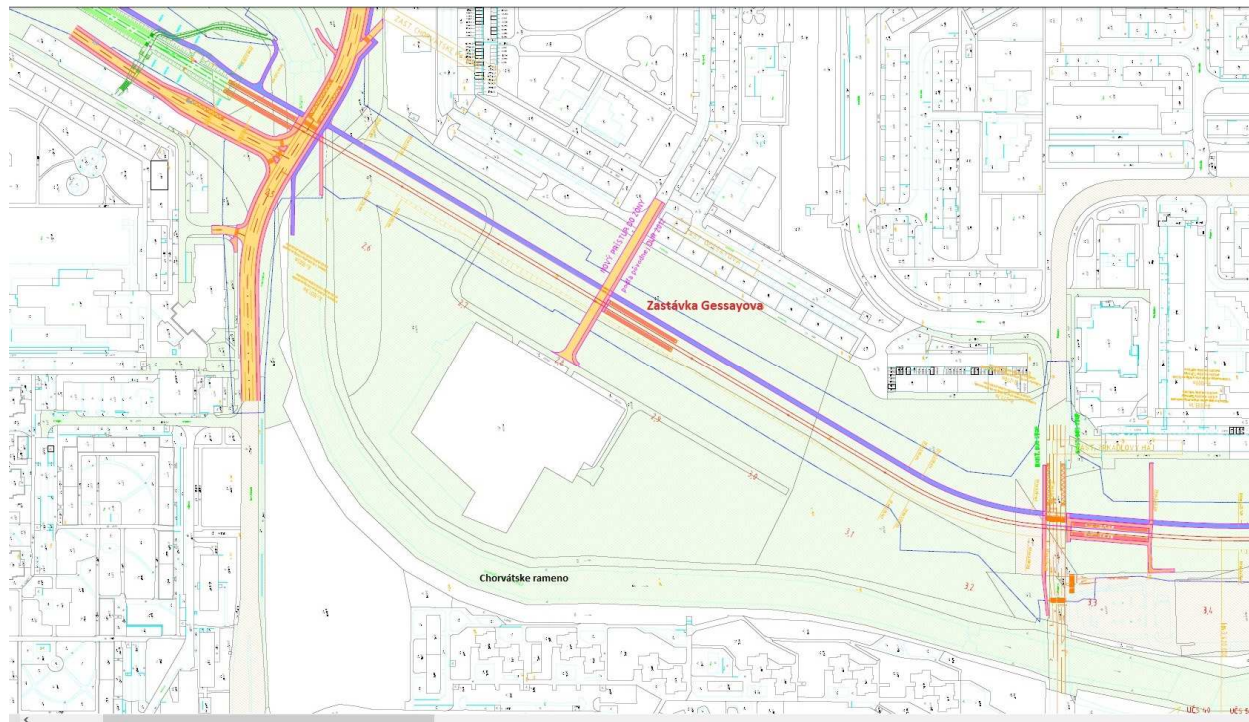

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 20.04.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 12      za: 12 proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 20. 04. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 15.06.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 9                      za: 9 proti: 0                      zdržal sa: 0                      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 15. 06. 2015



**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 21.09.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 21. 09. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 12.10.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“

**Hlasovanie:** prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 12. 10. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 09.11.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**a) berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“

Hlasovanie:      prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Stanovisko bolo prijaté.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.

predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 09. 11. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 07.12.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 07. 12. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 07.03.2016**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“

**Hlasovanie:** prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 07.03.2016

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 04.04.2016**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Stanovisko:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“

**Hlasovanie:** prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0

Stanovisko bolo prijaté.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 04.04.2016

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 06.06.2016**

**K bodu 2  
Nosný systém MHD – informácia.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Nosný systém MHD - informácia“

**Hlasovanie:**    prítomní: 9        za: 9        proti: 0        zdržal sa: 0        nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 06.06.2016

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 22.09.2016**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Stanovisko:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**a) odporúča**

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

zobrať na vedomie predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**b) odporúča**

Oddeleniu stratégie a projektov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy

vyriešenie prístupu pre peších a cyklistov zo západnej strany cez Chorvátske rameno k zástavke Gessayova premostením Chorvátskeho ramena, napríklad v podobe ľahkej lávky.

**Hlasovanie:**            prítomní: 4      za: 4      proti: 0            zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Stanovisko bolo odsúhlasené.

JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 22.09.2016



**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 17.10.2016**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Stanovisko:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**a) berie na vedomie**

predložený materiál „Nosný systém MHD - informácia“

**b) odporúča**

primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy hľadať riešenie pre realizáciu lávky pre peších a cyklistov ponad Chorvátske rameno k budúcej zastávke električiek „Gessayova“

**Hlasovanie:**            prítomní: 9    za: 9    proti: 0            zdržal sa: 0    nehlasoval: 0

Stanovisko bolo odsúhlasené.

JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 17.10.2016

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 07.11.2016**

**K bodu 3**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Stanovisko:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**a) berie na vedomie**

ústnu informáciu stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

**Hlasovanie:**            prítomní: 7    za: 6    proti: 0            zdržal sa: 1    nehlasoval: 0

Stanovisko bolo prijaté.

JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 07.11.2016

Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 28.11. 2016

**K bodu 5**  
**Nosný systém MHD – informácia.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po dohode

**presúva**

materiál „Nosný systém MHD – informácia“ na ďalšie najbližšie zasadanie.

**Hlasovanie:** prítomní: 12      za: 12      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 28.11.2016

**Uznesenie č. 453/2016**

zo dňa 24.11.2016

Mestská rada po prerokovaní materiálu

**A. berie na vedomie**

informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).

**B. schvaľuje**

zmenu termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 55/2015 časť B zo dňa 26. 02. 2015 z pôvodného termínu „mesačne“ na nový termín „3 mesiace“.
